


Einblas - Protokoll		
Bauvorhaben Nr.:	Kabel G5407.1 24x12	Datum, Startzeit:
Streckenabschnitt / NVt	G5407 zu G6105	10.03.2026 15:11:18
Firma:	H&S Technik GmbH	Einbläser
Bemerkungen	Weiterblasen von KL2 zu G6105 bis kabelstopp nach 341m	L.Hesse
Rohrparameter		Einblasgerät/Kompressor
Hersteller	GM-Plast	Einblasgerät/Kompressor: Miniflow
Rohrverband:	SNRV 7x16	+ Schmierstoffgeber [nein]
Rohr:	SNR 7x16	Gleitmittel: CableJettingLube CJL
Farbe-Kennung:	Rot	Kompressor: Kaeser M17
Rohrrinnenwand:	gerieft	+ Ölabscheider [nein] + Nachkühler [ja]
SNR-Temperatur:	8	Kabel-Einblaskappe [nein]
Zusammenfassung		
Entfernung: 341m	Einblaszeit:00:19:19	Wetter: - Ort(GPS):00812.2871 /5208.3670

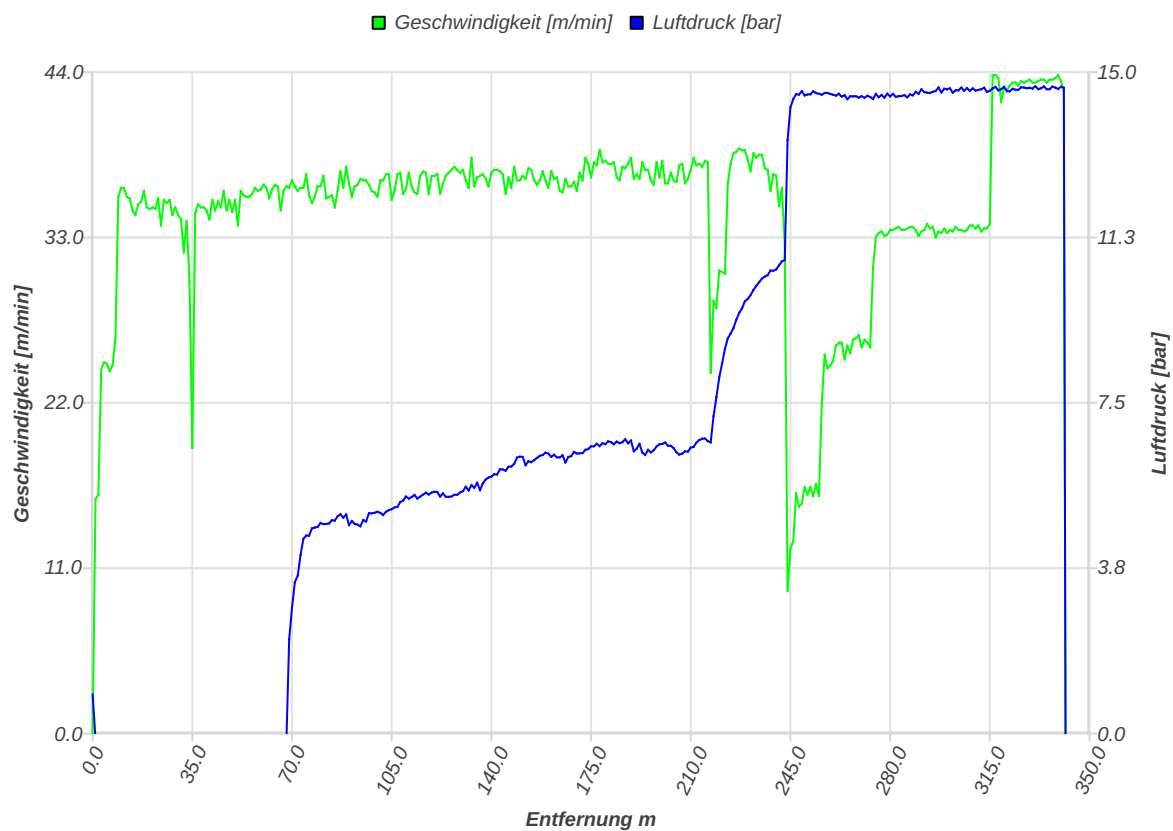

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
0	0,0	0,884986	15:11:18
1	15,6	-0,128099	15:11:48
2	15,9	-0,174931	15:11:51
3	24,2	-0,183884	15:11:54
4	24,7	-0,205234	15:11:56
5	24,6	-0,193526	15:11:59
6	24,1	-0,194904	15:12:01
7	24,5	-0,22314	15:12:03
8	26,3	-0,219008	15:12:05
9	35,7	-0,209366	15:12:07
10	36,3	-0,213499	15:12:09
11	36,3	-0,226584	15:12:10
12	35,7	-0,21832	15:12:12
13	35,6	-0,221763	15:12:14
14	34,8	-0,224518	15:12:15
15	34,5	-0,202479	15:12:17
16	35,2	-0,21832	15:12:19
17	35,4	-0,221763	15:12:20
18	36,1	-0,22314	15:12:22
19	35,0	-0,233471	15:12:23
20	34,9	-0,219008	15:12:25
21	35,0	-0,22865	15:12:27
22	34,9	-0,236915	15:12:28
23	35,6	-0,210055	15:12:30
24	33,8	-0,225207	15:12:32
25	35,5	-0,219008	15:12:33
26	35,3	-0,227273	15:12:35
27	35,5	-0,221074	15:12:37
28	34,5	-0,235537	15:12:38
29	35,0	-0,21281	15:12:40
30	34,5	-0,214187	15:12:42
31	34,2	-0,223829	15:12:43
32	32,0	-0,22314	15:12:45
33	34,1	-0,222452	15:12:47
34	30,1	-0,220386	15:12:49
35	19,0	-0,223829	15:12:51
36	34,6	-0,215565	15:12:53
37	35,2	-0,217631	15:12:55
38	35,0	-0,219697	15:12:56
39	35,0	-0,217631	15:12:58
40	34,8	-0,195592	15:13:00
41	34,2	-0,230716	15:13:01
42	35,5	-0,226584	15:13:03
43	34,8	-0,22314	15:13:04
44	35,4	-0,21832	15:13:06
45	35,0	-0,229339	15:13:08
46	36,1	-0,222452	15:13:09
47	34,8	-0,215565	15:13:11
48	35,5	-0,19697	15:13:13
49	34,7	-0,216942	15:13:14

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
50	35,5	-0,221763	15:13:16
51	33,8	-0,206612	15:13:18
52	36,1	-0,226584	15:13:19
53	35,8	-0,216942	15:13:21
54	35,7	-0,221763	15:13:23
55	35,7	-0,214187	15:13:24
56	35,9	-0,230716	15:13:26
57	36,3	-0,22314	15:13:27
58	36,1	-0,194904	15:13:29
59	36,2	-0,205234	15:13:31
60	36,5	-0,223829	15:13:32
61	36,3	-0,227961	15:13:34
62	35,6	-0,220386	15:13:35
63	36,2	-0,225207	15:13:37
64	36,5	-0,243802	15:13:39
65	36,4	-0,216253	15:13:40
66	34,8	-0,221763	15:13:42
67	36,1	-0,224518	15:13:44
68	36,4	-0,230028	15:13:45
69	36,3	2,13912	15:13:47
70	36,8	2,86433	15:13:48
71	36,4	3,43457	15:13:50
72	36,1	3,57989	15:13:52
73	36,3	4,0551	15:13:53
74	36,3	4,41736	15:13:55
75	37,2	4,49036	15:13:56
76	35,8	4,4876	15:13:58
77	35,3	4,6522	15:14:00
78	35,7	4,67287	15:14:01
79	36,4	4,68664	15:14:03
80	36,4	4,77479	15:14:04
81	37,1	4,75069	15:14:06
82	35,6	4,75275	15:14:08
83	35,7	4,76584	15:14:09
84	35,8	4,83815	15:14:11
85	35,0	4,8292	15:14:12
86	36,1	4,92631	15:14:14
87	37,4	4,97314	15:14:15
88	36,3	4,89601	15:14:17
89	37,7	4,96901	15:14:19
90	36,6	4,72727	15:14:20
91	35,7	4,82025	15:14:22
92	36,4	4,7562	15:14:23
93	36,5	4,73829	15:14:25
94	36,9	4,7011	15:14:27
95	36,8	4,84229	15:14:28
96	36,8	4,80716	15:14:30
97	36,5	4,99656	15:14:31
98	36,1	4,9938	15:14:33
99	36,0	5,00689	15:14:35

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
100	35,7	5,02961	15:14:36
101	36,8	5,00413	15:14:38
102	36,8	4,95868	15:14:39
103	37,2	5,0303	15:14:41
104	37,2	5,06749	15:14:42
105	35,5	5,08815	15:14:44
106	36,1	5,1281	15:14:46
107	37,2	5,14118	15:14:47
108	37,3	5,24862	15:14:49
109	35,9	5,28375	15:14:50
110	36,2	5,37603	15:14:52
111	37,3	5,32713	15:14:53
112	36,4	5,36295	15:14:55
113	36,0	5,40978	15:14:57
114	35,9	5,32989	15:14:58
115	37,1	5,37328	15:15:00
116	37,4	5,41873	15:15:01
117	37,3	5,46143	15:15:03
118	35,9	5,42149	15:15:05
119	37,1	5,4635	15:15:06
120	37,1	5,48347	15:15:08
121	37,2	5,47796	15:15:09
122	35,9	5,37466	15:15:11
123	36,6	5,44697	15:15:12
124	37,1	5,37052	15:15:14
125	37,3	5,36777	15:15:15
126	37,5	5,37741	15:15:17
127	37,7	5,4146	15:15:19
128	37,5	5,41598	15:15:20
129	37,3	5,46694	15:15:22
130	37,5	5,49656	15:15:23
131	36,8	5,59711	15:15:25
132	36,3	5,5124	15:15:26
133	38,3	5,63361	15:15:28
134	36,4	5,57369	15:15:30
135	37,0	5,68802	15:15:31
136	37,1	5,5186	15:15:33
137	37,2	5,67287	15:15:34
138	36,9	5,76102	15:15:36
139	36,4	5,8051	15:15:37
140	37,3	5,8292	15:15:39
141	37,5	5,88085	15:15:41
142	37,5	5,87466	15:15:42
143	37,4	5,99174	15:15:44
144	37,2	5,98898	15:15:45
145	35,9	5,96074	15:15:47
146	37,0	6,0489	15:15:48
147	36,3	6,05647	15:15:50
148	37,7	6,11639	15:15:52
149	36,8	6,25895	15:15:53

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
150	36,8	6,27893	15:15:55
151	37,1	6,27273	15:15:56
152	36,9	6,08609	15:15:58
153	37,6	6,17493	15:15:59
154	37,5	6,15496	15:16:01
155	36,8	6,19972	15:16:02
156	36,5	6,25	15:16:04
157	36,8	6,29752	15:16:06
158	37,4	6,31818	15:16:07
159	36,8	6,37052	15:16:09
160	36,3	6,34848	15:16:10
161	37,4	6,27686	15:16:12
162	36,9	6,32163	15:16:13
163	37,0	6,26377	15:16:15
164	36,1	6,26309	15:16:16
165	36,0	6,30992	15:16:18
166	36,9	6,14807	15:16:20
167	36,4	6,27066	15:16:21
168	36,4	6,29063	15:16:23
169	36,7	6,38567	15:16:24
170	36,1	6,35124	15:16:26
171	37,3	6,35606	15:16:27
172	36,8	6,36019	15:16:29
173	38,3	6,43182	15:16:31
174	37,9	6,45317	15:16:32
175	37,0	6,51171	15:16:34
176	38,0	6,51515	15:16:35
177	37,8	6,57094	15:16:37
178	38,8	6,51997	15:16:38
179	38,0	6,58264	15:16:40
180	38,1	6,56198	15:16:41
181	37,9	6,62672	15:16:43
182	37,9	6,60744	15:16:45
183	38,0	6,56267	15:16:46
184	37,0	6,62052	15:16:48
185	36,8	6,58609	15:16:49
186	37,7	6,60744	15:16:51
187	37,6	6,67562	15:16:52
188	37,9	6,58264	15:16:54
189	38,3	6,64601	15:16:55
190	36,9	6,4022	15:16:57
191	37,2	6,45937	15:16:59
192	36,9	6,57025	15:17:00
193	38,0	6,36983	15:17:02
194	37,5	6,31956	15:17:03
195	37,5	6,4332	15:17:05
196	36,8	6,37603	15:17:06
197	36,5	6,42493	15:17:08
198	38,0	6,51033	15:17:09
199	37,0	6,55992	15:17:11

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
200	38,1	6,56818	15:17:12
201	36,6	6,60124	15:17:14
202	36,6	6,52824	15:17:16
203	37,3	6,52342	15:17:17
204	36,8	6,47383	15:17:19
205	36,7	6,3781	15:17:20
206	37,8	6,32576	15:17:22
207	37,9	6,3478	15:17:23
208	36,6	6,40083	15:17:25
209	36,9	6,39394	15:17:26
210	37,5	6,48416	15:17:28
211	38,3	6,50207	15:17:29
212	37,8	6,60055	15:17:31
213	37,9	6,65565	15:17:33
214	37,7	6,68526	15:17:34
215	38,1	6,69077	15:17:36
216	38,0	6,63154	15:17:37
217	24,0	6,60331	15:19:03
218	28,8	7,1949	15:19:05
219	28,3	7,6281	15:19:07
220	30,8	8,07576	15:19:09
221	30,7	8,3905	15:19:10
222	30,6	8,72176	15:19:12
223	36,6	8,96074	15:19:14
224	37,9	9,073	15:19:15
225	38,6	9,19628	15:19:17
226	38,7	9,3843	15:19:19
227	38,9	9,5365	15:19:20
228	38,8	9,64256	15:19:22
229	38,8	9,80096	15:19:23
230	38,2	9,85606	15:19:25
231	37,4	9,94215	15:19:26
232	38,6	10,0585	15:19:28
233	38,3	10,1515	15:19:29
234	38,5	10,2355	15:19:31
235	38,5	10,3175	15:19:32
236	37,6	10,3623	15:19:34
237	37,5	10,3967	15:19:35
238	36,1	10,4993	15:19:37
239	37,2	10,4952	15:19:39
240	37,1	10,5255	15:19:40
241	35,1	10,6171	15:19:42
242	36,3	10,708	15:19:43
243	32,5	10,7376	15:19:45
244	9,5	13,4621	15:20:05
245	12,3	14,2025	15:20:10
246	12,8	14,3871	15:20:14
247	16,0	14,4986	15:20:19
248	15,1	14,4904	15:20:22
249	15,3	14,5682	15:20:26

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
250	16,4	14,4704	15:20:30
251	15,9	14,4938	15:20:33
252	16,4	14,4966	15:20:37
253	15,8	14,5647	15:20:41
254	16,6	14,5248	15:20:44
255	15,8	14,5096	15:20:48
256	21,9	14,4862	15:20:50
257	25,2	14,5255	15:20:53
258	24,3	14,5275	15:20:55
259	24,5	14,5048	15:20:57
260	24,8	14,4862	15:20:59
261	25,8	14,4676	15:21:02
262	26,0	14,5083	15:21:04
263	26,0	14,4442	15:21:06
264	24,9	14,4759	15:21:09
265	25,8	14,3871	15:21:11
266	25,3	14,4511	15:21:13
267	26,2	14,4504	15:21:15
268	26,3	14,4518	15:21:18
269	26,5	14,4208	15:21:20
270	25,7	14,4545	15:21:22
271	26,2	14,4187	15:21:24
272	26,0	14,4621	15:21:27
273	25,7	14,4366	15:21:29
274	31,0	14,3905	15:21:31
275	33,0	14,5048	15:21:33
276	33,3	14,4311	15:21:34
277	33,4	14,4814	15:21:36
278	33,1	14,4201	15:21:38
279	33,2	14,5096	15:21:40
280	33,5	14,449	15:21:41
281	33,5	14,5048	15:21:43
282	33,6	14,4387	15:21:45
283	33,7	14,4539	15:21:47
284	33,5	14,458	15:21:48
285	33,5	14,4787	15:21:50
286	33,6	14,4298	15:21:52
287	33,7	14,4952	15:21:54
288	33,7	14,4738	15:21:55
289	33,5	14,551	15:21:57
290	33,1	14,5076	15:21:59
291	33,4	14,6102	15:22:01
292	33,5	14,5489	15:22:02
293	33,9	14,5337	15:22:04
294	33,6	14,5262	15:22:06
295	33,7	14,5544	15:22:08
296	33,0	14,5723	15:22:09
297	33,4	14,6515	15:22:11
298	33,3	14,5379	15:22:13
299	33,6	14,6226	15:22:15

Streckenlänge [m]	Geschwindigkeit [m/min]	Rohr-Druck [bar]	Uhrzeit [hh:mm:ss]
300	33,3	14,6095	15:22:16
301	33,5	14,6329	15:22:18
302	33,4	14,5331	15:22:20
303	33,7	14,5882	15:22:22
304	33,5	14,5875	15:22:23
305	33,5	14,6488	15:22:25
306	33,4	14,5778	15:22:27
307	33,5	14,6364	15:22:29
308	33,8	14,5758	15:22:30
309	33,8	14,6309	15:22:32
310	33,6	14,5813	15:22:34
311	33,8	14,5964	15:22:36
312	33,4	14,6123	15:22:37
313	33,6	14,6453	15:22:39
314	33,6	14,5523	15:22:41
315	33,9	14,5744	15:22:42
316	43,8	14,6302	15:22:44
317	43,8	14,6639	15:22:45
318	43,6	14,5868	15:22:46
319	42,0	14,6129	15:22:48
320	43,0	14,6639	15:22:49
321	42,8	14,5675	15:22:50
322	43,1	14,5647	15:22:52
323	43,3	14,6205	15:22:53
324	43,3	14,6006	15:22:54
325	43,1	14,5978	15:22:56
326	43,4	14,655	15:22:57
327	43,3	14,6501	15:22:59
328	43,4	14,6357	15:23:00
329	43,5	14,6439	15:23:01
330	43,3	14,6281	15:23:03
331	43,3	14,6784	15:23:04
332	43,4	14,6123	15:23:05
333	43,5	14,6343	15:23:07
334	43,5	14,6756	15:23:08
335	43,3	14,6116	15:23:09
336	43,5	14,6129	15:23:11
337	43,5	14,6722	15:23:12
338	43,6	14,6481	15:23:13
339	43,8	14,6185	15:23:15
340	43,4	14,6653	15:23:16
341	42,8	14,6453	15:23:17
341.6	0	-0,223829	15:30:38

Unterschrift Bearbeiter

Unterschrift Kunde
